

TARGET2/T2S-Konsolidierung

– ein gemeinsamer Blick voraus

Frankfurt am Main, Dezember 2020



TARGET2/T2S-Konsolidierung

– ein gemeinsamer Blick voraus

Begrüßung & Einleitung

- 1 **Community Readiness Monitoring – wo kommen wir her?**
- 2 **Community Readiness Monitoring – was gibt's Neues?**
- 3 **Wir an Ihrer Seite: Vorbereitung der Teilnehmer**
- 4 **Wie geht es konkret weiter?**

Ein gemeinsamer Blick voraus

Einleitung

- **Wiederholter Wunsch des europäischen Kreditgewerbes nach Verschiebung der Einführung des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts.**
 - Diverse Gremien mit Marktteilnehmern im April und Mai 2020
 - Brief der europäischen Bankenverbände vom 7. Mai 2020
- **Die Bedenken des Kreditgewerbes beziehen sich auf sämtliche regulatorische Projekte (z. B. auch Anforderungen aus CSDR und SRD-II).**
- **Hauptgründe:**
 - Corona-Pandemie (COVID-19)
 - SWIFT-Entscheidung zur Verschiebung des Starts der ISO 20022-Migration im Korrespondenzbankgeschäft

Ein gemeinsamer Blick voraus

Einleitung

- **Entscheidung des EZB-Rats am 27. Juli 2020:**
 - **Verlängerung** der Projektlaufzeit der TARGET2/T2S-Konsolidierung **um 12 Monate**
 - Neuer Go-live-Termin: **21. November 2022**
 - Beginn Nutzertests: **1. Dezember 2021**
- Die Projektverlängerung macht eine **Anpassung der Projektmeilensteine und der Berichterstattung** über den Projektfortschritt erforderlich.

TARGET2/T2S-Konsolidierung

– ein gemeinsamer Blick voraus

Begrüßung & Einleitung

1 Community Readiness Monitoring – wo kommen wir her?

2 Community Readiness Monitoring – was gibt's Neues?

3 Wir an Ihrer Seite: Vorbereitung der Teilnehmer

4 Wie geht es konkret weiter?

Ein gemeinsamer Blick voraus

Community Readiness Monitoring: Wo kommen wir her?

Zur Erinnerung: Die Eckpfeiler des Community Readiness Monitoring


- Basis bilden die „Project Key Milestones“.
- **Jedes Institut** ist für die Schaffung der eigenen Migrationsbereitschaft **selbst verantwortlich**.
- Die Notenbanken begleiten ihre Nutzergemeinschaften und überwachen den Vorbereitungsstand ihrer Community über regelmäßige Community Readiness Umfragen.
- Auf europäischer Ebene wird der Vorbereitungsstand aller Nutzergemeinschaften zusammengetragen und evaluiert.

Ziel: Die europaweit erfolgreiche Migration aller an T2 teilnehmenden Nutzergemeinschaften auf die neue Plattform im Rahmen des Big Bang im November 2022.

Ein gemeinsamer Blick voraus


Community Readiness Monitoring: Wo kommen wir her?

Die ursprünglichen Meilensteine für 2019 und 2020 im Überblick

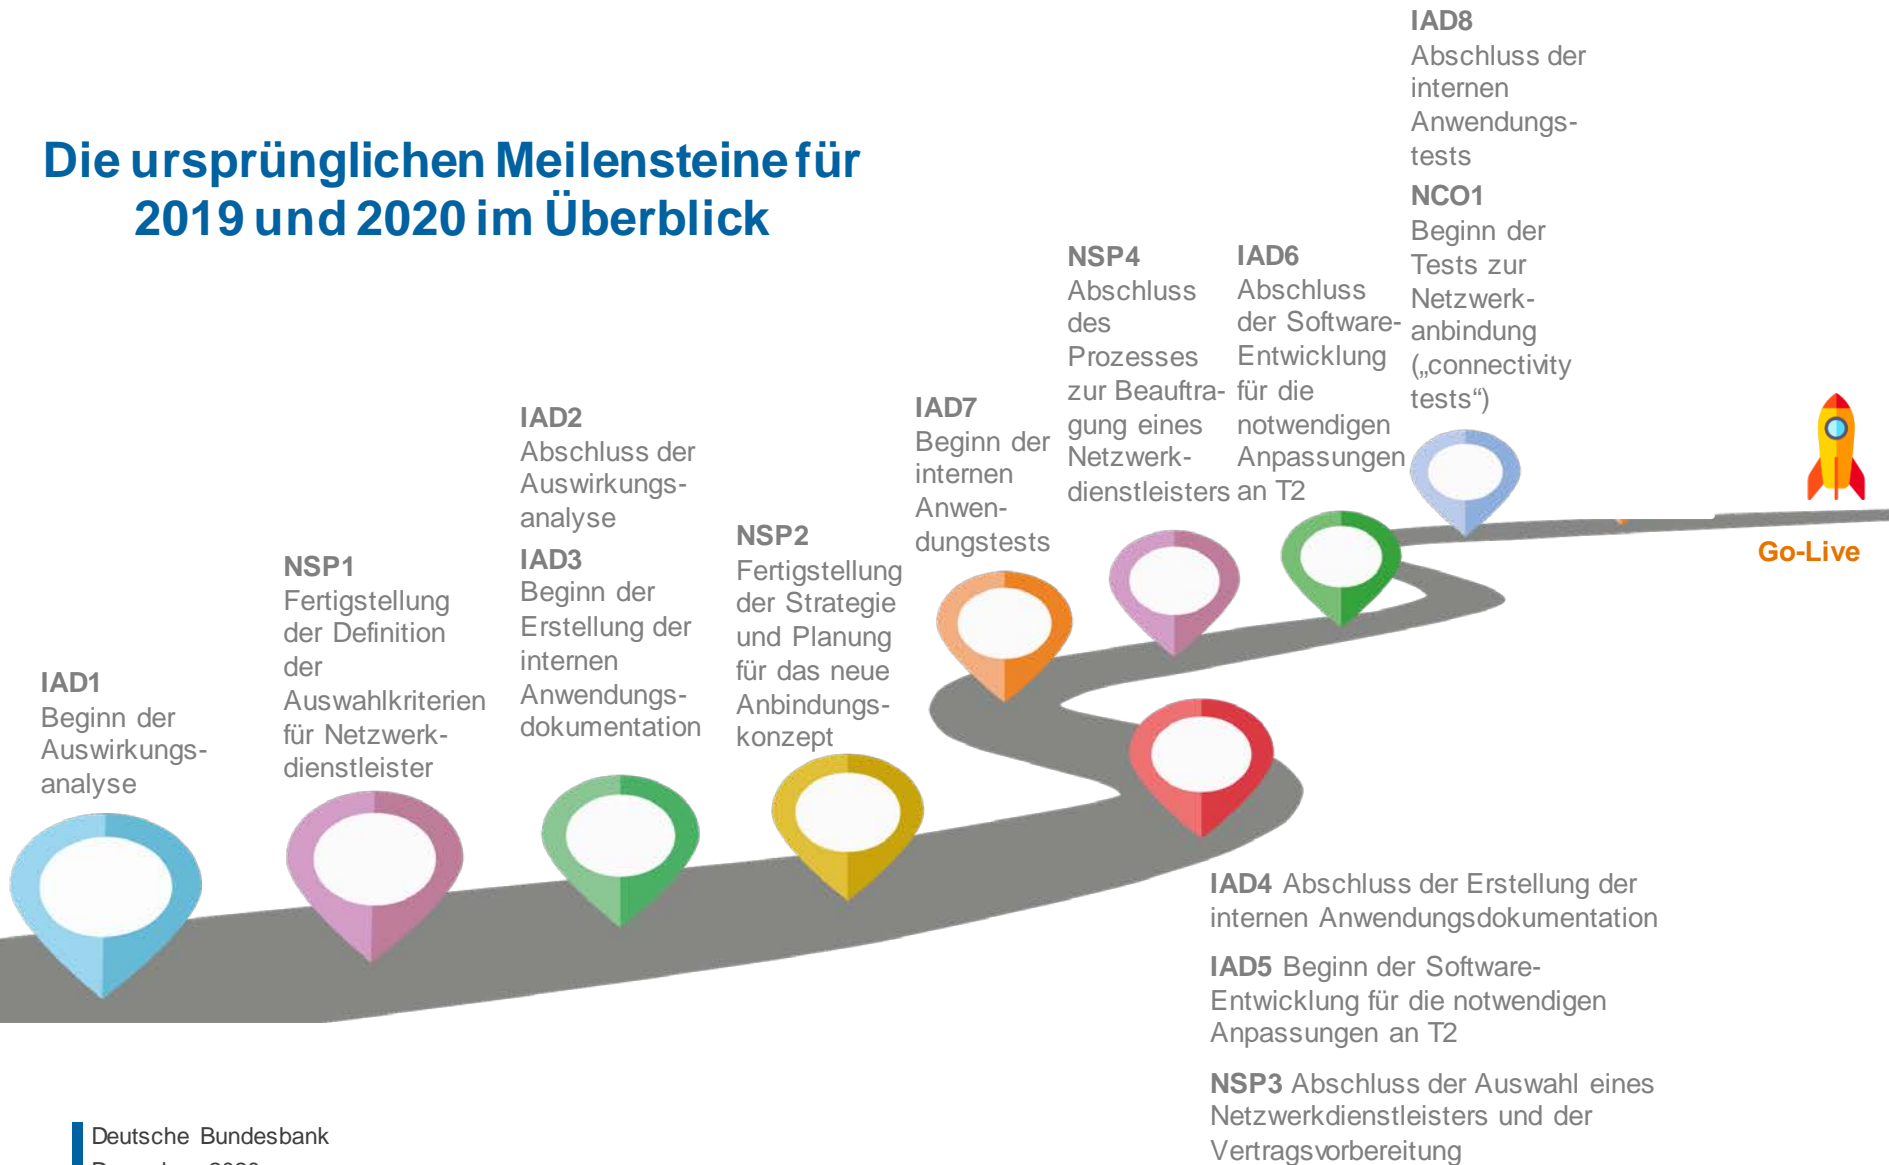

Ein gemeinsamer Blick voraus

Community Readiness Monitoring in Deutschland

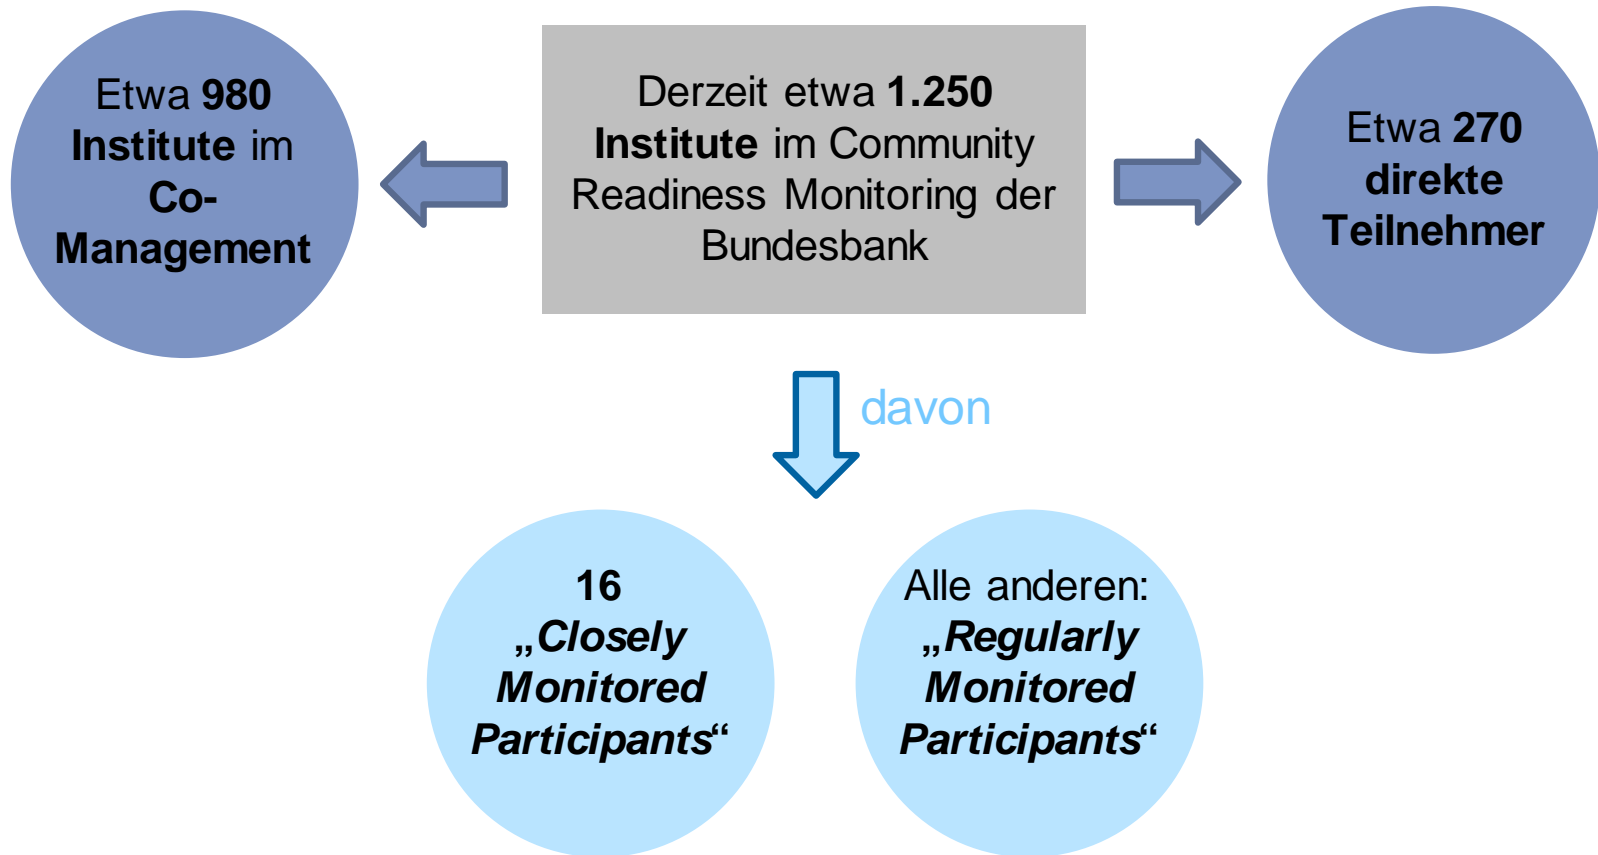

Ein gemeinsamer Blick voraus

Community Readiness Monitoring in Deutschland

- Die **letzte offizielle Community Readiness Umfrage** wurde zum **Stichtag 31. März 2020** durchgeführt.
- Sie stand unter dem Schatten der gerade angebrochenen Corona-Pandemie und der von SWIFT Anfang März 2020 angekündigten Verschiebung der ISO 20022-Migration im Korrespondenzbankgeschäft.

Welche Meilensteine wurden abgefragt?

- **IAD4** „Abschluss der Erstellung der internen Anwendungsdokumentation“.
- **IAD5** „Beginn der Software-Entwicklungen für die nötigen Anpassungen an T2“.

Der ursprünglich ebenfalls auf den 31. März 2020 datierte Meilenstein NSP3 („Abschluss der Auswahl eines Netzwerkdienstleisters und der Vertragsvorbereitung“) wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden extrem eingeschränkten Mobilität verschoben.

Ein gemeinsamer Blick voraus

Community Readiness Monitoring in Deutschland


Ergebnisse für den deutschen Markt (Stand 31. März 2020)

- Zum damaligen Meldestichtag hatten
 - **38 %** der „Closely Monitored Participants“ (5 von damals 13) und **11 %** der „Regularly Monitored Participants“ Status „**grün**“ gemeldet,
 - **62 %** der „Closely Monitored Participants“ (8 von damals 13) und **86 %** der „Regularly Monitored Participants“ Status „**gelb**“ gemeldet.
- **Sieben** „Regularly Monitored Participants“ hatten Status „**rot**“ gemeldet.
- IAD4 wurde von 10 % der "Regularly Monitored Participants" und fünf der damals 13 "Closely Monitored Participants" erfüllt.
- IAD5 wurde von über 90 % der "Regularly Monitored Participants" und neun der damals 13 "Closely Monitored Participants" erreicht.

Ein gemeinsamer Blick voraus


Community Readiness Monitoring in Deutschland

Einschätzung der Migrationsbereitschaft
der **CMPs** Ende März 2020

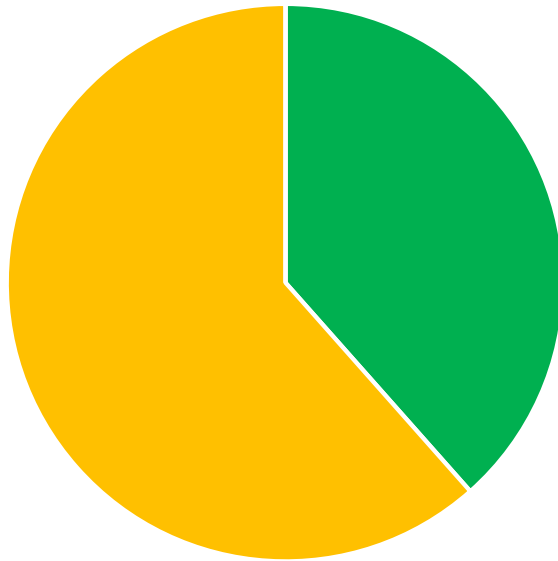

■ Grün ■ Gelb

Einschätzung der Migrationsbereitschaft
der **RMPs** Ende März 2020

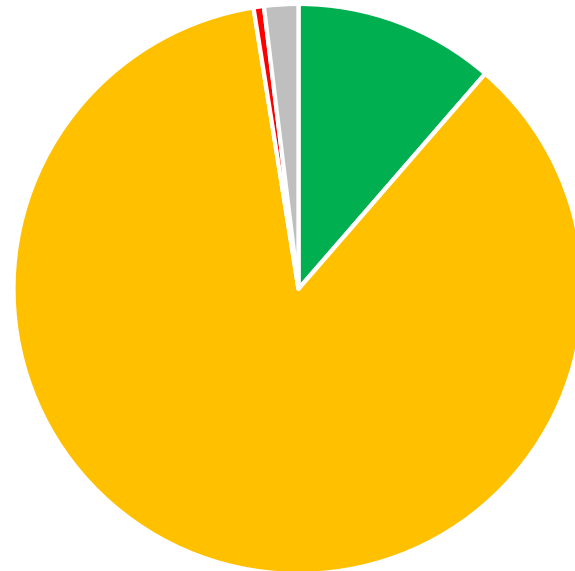

■ Grün ■ Gelb ■ Rot ■ Keine Antwort



Und wie sieht es jetzt aus?

TARGET2/T2S-Konsolidierung

– ein gemeinsamer Blick voraus

Begrüßung & Einleitung

1 Community Readiness Monitoring – wo kommen wir her?

2 Community Readiness Monitoring – was gibt's Neues?

3 Wir an Ihrer Seite: Vorbereitung der Teilnehmer

4 Wie geht es konkret weiter?

Ein gemeinsamer Blick voraus

Community Readiness Monitoring – was gibt's Neues?

– **Anpassungen:**

- Neuer Meilensteinplan wurde Mitte November veröffentlicht.
- Das Ergänzungsdokument zu den Projektmeilensteinen wird aktualisiert.
- Erweiterung um **vier neue Meilensteine** für Teilnehmer (von bisher 22 auf nunmehr 26).
- Mehr Zeit für die Erfüllung der meisten noch ausstehenden Meilensteine.
- In der Regel liegen die Meilensteine für den Start bestimmter Aktivitäten an einem Monatsersten und der Abschluss von Aktivitäten an einem Monatsletzten.

– **Berichtszyklus:** Immer zum Ende eines jeden Quartals.

- Abfrage aller in diesem Quartal **fällig gewordenen Meilensteine** zuzüglich derer, die ein Institut **bisher erfüllt haben sollte**.
- **Neu:** Jede Meilensteinumfrage enthält eine **Abfrage der Erwartungshaltung** zu der Erfüllung anstehender Meilensteine.

Ein gemeinsamer Blick voraus

Community Readiness Monitoring – was gibt's Neues?

IAD7 (01/03)
Beginn der internen Anwendungstests

IAD6 (30/06)
Abschluss der Software-Entwicklung für die notwendigen Anpassungen an T2

NSP3 (31/03)
Abschluss der Auswahl eines Netzwerkdienstleisters und der Vertragsvorbereitung

NSP4 (30/06)
Abschluss des Prozesses zur Beauftragung eines Netzwerkdienstleisters

IAD8 (31/08)
Abschluss der internen Anwendungstests

UTA1 (01/12)
Beginn der Nutzertestaktivitäten

NCOP1 (01/05)
Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung

NCOP2 (31/07)
Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung

OPA (30/09)
Abschluss der Anpassungen der Betriebsabläufe

CLA (30/09)
Abschluss der vertraglichen und rechtlichen Anpassungen

UTA2 (30/09)
Abschluss der Nutzertestaktivitäten

Nov. 2022 Go-Live

MIG1 (22/08):
Beginn der Vorbereitung auf die Migration („pre-migration“)

MIG2 (31/10):
Abschluss der Vorbereitung auf die Migration („pre-migration“)

NCO2 (30/11)
Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung („connectivity tests“)

NCO1 (01/09)
Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung („connectivity tests“)

IST2 (30/11)
Abschluss der Schulungen für Nutzertests


IST1 (01/09)
Beginn der Schulungen für Nutzertests

Ein gemeinsamer Blick voraus

Community Readiness Monitoring – was gibt's Neues?

Keine weiteren Meilensteine in Q1/Q2 2022?

- Gegenwärtig werden die Testdokumente erstellt, darunter das **T2 Testing Reporting Framework**.
- Es wird während der Testdurchführungsphase dazu dienen, den Fortschritt und den Status der Tests zu überwachen.

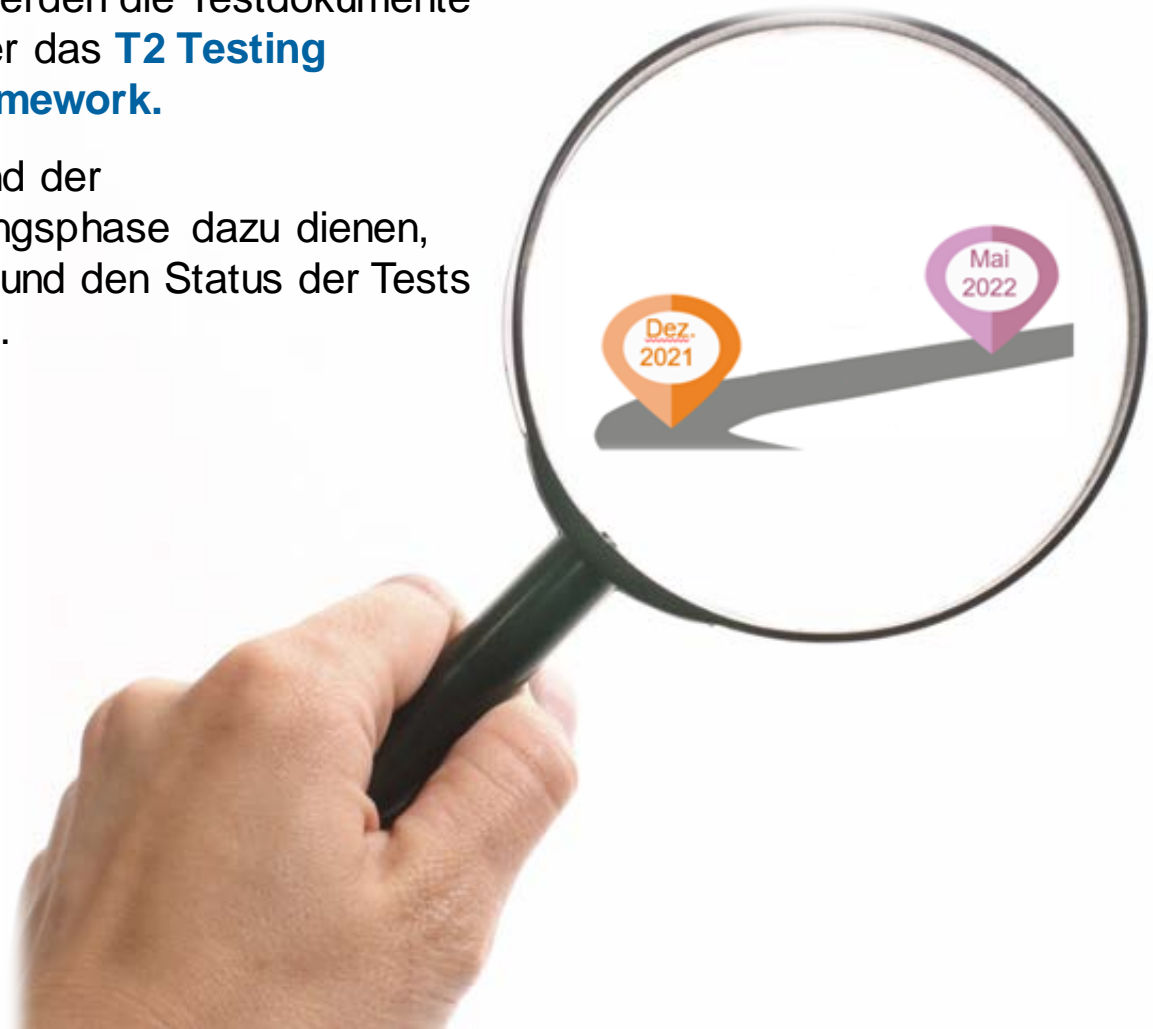

Ein gemeinsamer Blick voraus

Sie sind gefragt

Wie weit sind Sie mit der Auswahl Ihres Netzwerkdienstleisters (Network Service Provider, NSP)?

A) Der Vertrag ist unter Dach und Fach: Mein NSP steht fest.

B) Der Vertrag wurde noch nicht geschlossen: Es gibt noch inhaltliche offene Punkte, aber wir sind in gutem Austausch mit dem NSP.

C) Der Vertrag wurde noch nicht geschlossen: Die Kommunikation mit dem NSP läuft schleppend.

D) Der Vertrag wurde noch nicht geschlossen: Es liegt an anderen Gründen.



TARGET2/T2S-Konsolidierung

– ein gemeinsamer Blick voraus

Begrüßung & Einleitung

1 Community Readiness Monitoring – wo kommen wir her?

2 Community Readiness Monitoring – was gibt's Neues?

3 Wir an Ihrer Seite: Vorbereitung der Teilnehmer

4 Wie geht es konkret weiter?

Ein gemeinsamer Blick voraus

Wir an Ihrer Seite: Vorbereitung der Teilnehmer



Schulungs- und Informationsangebote passend zum Projektfortschritt

⇒ Auftaktveranstaltung im Frühjahr 2020, virtuelle Schulungsangebote im Herbst 2020, weitere Angebote in Planung



Alle aktuellen Informationen zum Projekt:
<https://www.bundesbank.de/konsolidierung>



Ihr zuständiger Kundenbetreuungsservice berät Sie gerne individuell.


Begrüßung & Einleitung

- 1 Community Readiness Monitoring – wo kommen wir her?
- 2 Community Readiness Monitoring – was gibt's Neues?
- 3 Wir an Ihrer Seite: Vorbereitung der Teilnehmer
- 4 **Wie geht es konkret weiter?**

Ein gemeinsamer Blick voraus

Wie geht es konkret weiter?

- **Ende Q4/2020:** Abfrage aller alten Meilensteine, die **bisher erfüllt sein sollten**, sowie die Abfrage der **Erwartungshaltung** zu den anstehenden Meilensteinen (⇒ IAD6, NSP3, IAD7).



- **Ende Q1/2021:** Abfrage neuer Meilensteine.

Ein gemeinsamer Blick voraus

Vielen Dank für Ihre Teilnahme

**Bei Fragen können Sie sich gerne an Ihren
Kundenbetreuungsservice (KBS) wenden!**

